

COMUNE DI VELO

PROVINCIA DI VICENZA

PROGETTO DI ESECUTIVO

**OGGETTO: REALIZZAZIONE DI TOMBOTTO IDRAULICO IN
LOCALITA' SANTINA**

DITTA: COMUNE DI VELO D'ASTICO

SEDE: P.zza VI Novembre 2, 36010 Velo d'Astico (VI)

CRONOPROGRAMMA

Maggio 2025

Il Progettista
(Gobbo Ing. Sergio)




N. ord.	Cod.	Attività	Inizio	Fine	Durata gg.	N. giorno
1	A	Consegna dei lavori	lunedì 7 luglio 2025			1
2	B	Preparazione Cantiere, posa recinzioni e new jersey	martedì 8 luglio 2025	09/07/2025	1	2
3	C	Predisposizione parcheggio provvisorio	mercoledì 9 luglio 2025	11/07/2025	2	4
4	D	Posa passerella ed opere provvisionali	venerdì 11 luglio 2025	15/07/2025	4	8
5	E	Taglio asfalto e scarifiche	martedì 15 luglio 2025	16/07/2025	1	9
6	F	Scavo a sezione in terreno normale	mercoledì 16 luglio 2025	17/07/2025	1	10
7	G	Scavo a sezione in terreno roccia	giovedì 17 luglio 2025	21/07/2025	4	14
8	H	Pulizia e regolarizzazione scavi	lunedì 21 luglio 2025	22/07/2025	1	15
9	I	Armo platea	martedì 22 luglio 2025	25/07/2025	3	18
10	L	Getto platea	venerdì 25 luglio 2025	26/07/2025	1	19
11	M	Pausa getto opere	sabato 26 luglio 2025	05/08/2025	10	29
12	N	Varo e posa scatolari	martedì 5 agosto 2025	06/08/2025	1	30
13	O	Armo soletta	mercoledì 6 agosto 2025	08/08/2025	2	32
14	P	getto soletta	venerdì 8 agosto 2025	09/08/2025	1	33
15	Q	Pausa getto opere	sabato 9 agosto 2025	19/08/2025	10	43
16	R	Rinfiacco scatolari e chiusura scavo.	martedì 19 agosto 2025	20/08/2025	1	44
17	S	Opere preparatorie all'asfaltatura	mercoledì 20 agosto 2025	24/08/2025	4	48
18	T	Asfaltatura	domenica 24 agosto 2025	27/08/2025	3	51
19	U	Posa guardrail	mercoledì 27 agosto 2025	30/08/2025	3	54
20	V	Smantellamenti e Completamenti	sabato 30 agosto 2025	01/09/2025	2	56
21	W	Controlli, verifiche, pulizie e smobilizzo	lunedì 1 settembre 2025	03/09/2025	2	58
	Z	Fine Lavori	venerdì 5 settembre 2025	05/09/2025		60

TC

60

gg.

naturali consecutivi

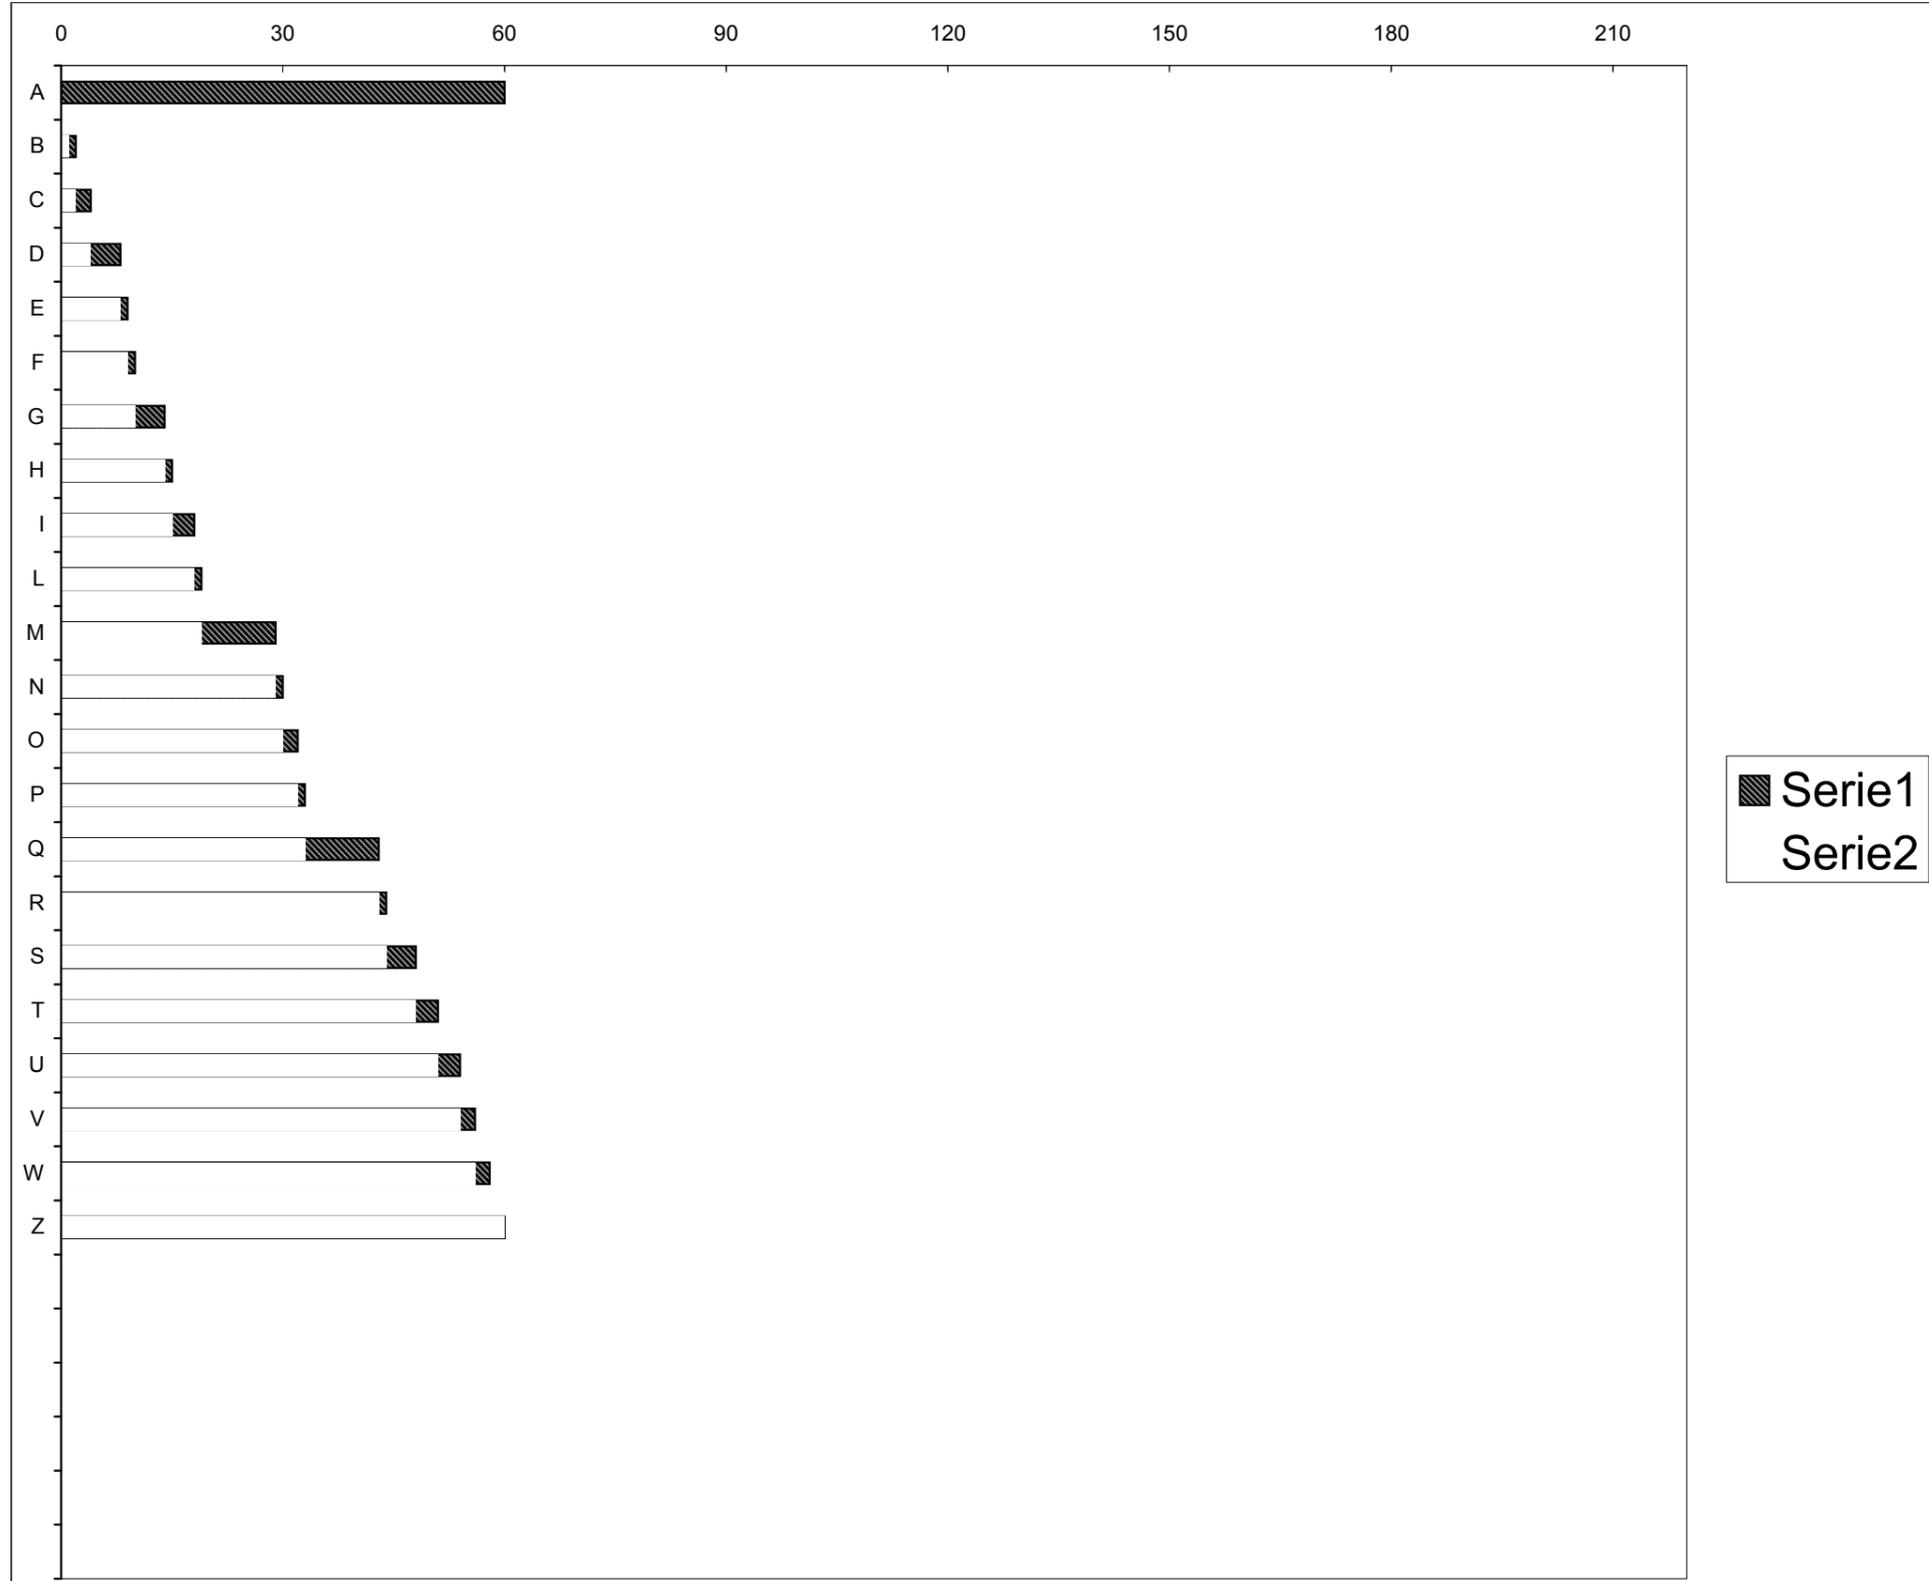

■ Serie1
□ Serie2

Fine lavori

gg

60 gg
